



Департамент внутренней и
кадровой политики Белгородской
области

ОГАПОУ «Валуйский колледж»



**ПРЕЗЕНТАЦИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОЕКТА
«ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА
«ПОДГОТОВКА И РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
НА САЙТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ »**

КАРТОЧКА ПРОЕКТА

«ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ И РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

НА САЙТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ »

<p>Общие данные: Заказчик: Заместитель директора ОГАПОУ «Валуйский колледж» Руководитель процесса: Крапивина Ирина Викторовна, преподаватель, руководитель ПЦК математических дисциплин и информационных технологий Команда проекта: Шамина Зинаида Павловна, преподаватель Страхова Олеся Викторовна, заведующий учебной частью Границы процесса: Начало процесса: подача информации на сайт Конец процесса: размещение информации на сайт</p>	<p>Обоснование:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Избыточность информации.2. Временные потери при загрузке нескольких изображений или файлов с большим объемом.3. Отсутствие подписей под рисунками и фотографиями.4. Отсутствие единого стиля оформления текстовой информации.5. Отсутствие своевременной проверки и утверждения материалов руководителями структурных подразделений.6. Отсутствие схемы ответственных лиц за разделы сайта.						
<p>Цель (и):</p> <table border="1" data-bbox="42 831 880 1192"><thead><tr><th>Наименование цели, ед. изм.</th><th>Текущий показатель</th><th>Целевой показатель</th></tr></thead><tbody><tr><td>Сокращение временных затрат и оптимизация процесса подготовки и загрузки на сайт образовательной организации информации.</td><td>220-425 мин.</td><td>150-325 мин.</td></tr></tbody></table> <p>Эффекты:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Экономия времени.2. Передача информации в сжатом виде.3. Единый стиль оформления материалов сайта.4. Своевременная проверка и утверждение материалов руководителями структурных подразделений.	Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	Сокращение временных затрат и оптимизация процесса подготовки и загрузки на сайт образовательной организации информации.	220-425 мин.	150-325 мин.	<p>Сроки реализации мероприятий проекта:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Старт проекта – утверждение команды по реализации проекта 03.02. 2020 г.)2. Анализ текущей ситуации (04.02– 27.02.2020г.):<ul style="list-style-type: none">• разработка текущей карты процесса (04.02.– 10.02.2020 г.);• поиск и выявление проблем (11.02– 16.02.2020 г.);• разработка целевой карты процесса (17.02 – 27.03.2020 г.).3. Защита каточки проекта 28.02.2020.4. Презентация проекта 30.02. 2020 г.5. Внедрение улучшений: 01.03 – 4.05.2020 г.6. Закрытие проекта: 04.05.2020 г.
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель					
Сокращение временных затрат и оптимизация процесса подготовки и загрузки на сайт образовательной организации информации.	220-425 мин.	150-325 мин.					

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

Карта текущего состояния процесса

«ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ И РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»



ВПП (время протекания процесса) – 220 мин. - 425 мин.

Условные обозначения:



Отсутствие единых требований по предоставлению информации на сайт



Отсутствие схемы ответственных лиц за разделы сайта

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

Пирамида проблем



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

Анализ проблем


Проблема	Способ решения	Экономия времени
<p>Избыточность информации. Временные потери при загрузке нескольких изображений или файлов с большим объемом. Отсутствие подписей под рисунками и фотографиями. Отсутствие единого стиля оформления текстовой информации.</p>	<p>Разработка требований к оформлению контента сайт ОГАПОУ «Валуйский колледж»</p>	<p>70 мин. – 140 мин.</p>
<p>Отсутствие своевременной проверки и утверждения материалов руководителями структурных подразделений. Отсутствие схемы ответственных лиц за разделы сайта</p>	<p>Разработка схемы ответственных лиц за разделы сайта</p>	<p>70 мин. – 140 мин.</p>

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

Карта текущего состояния процесса

«ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ И РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»

Линейный способ картирования

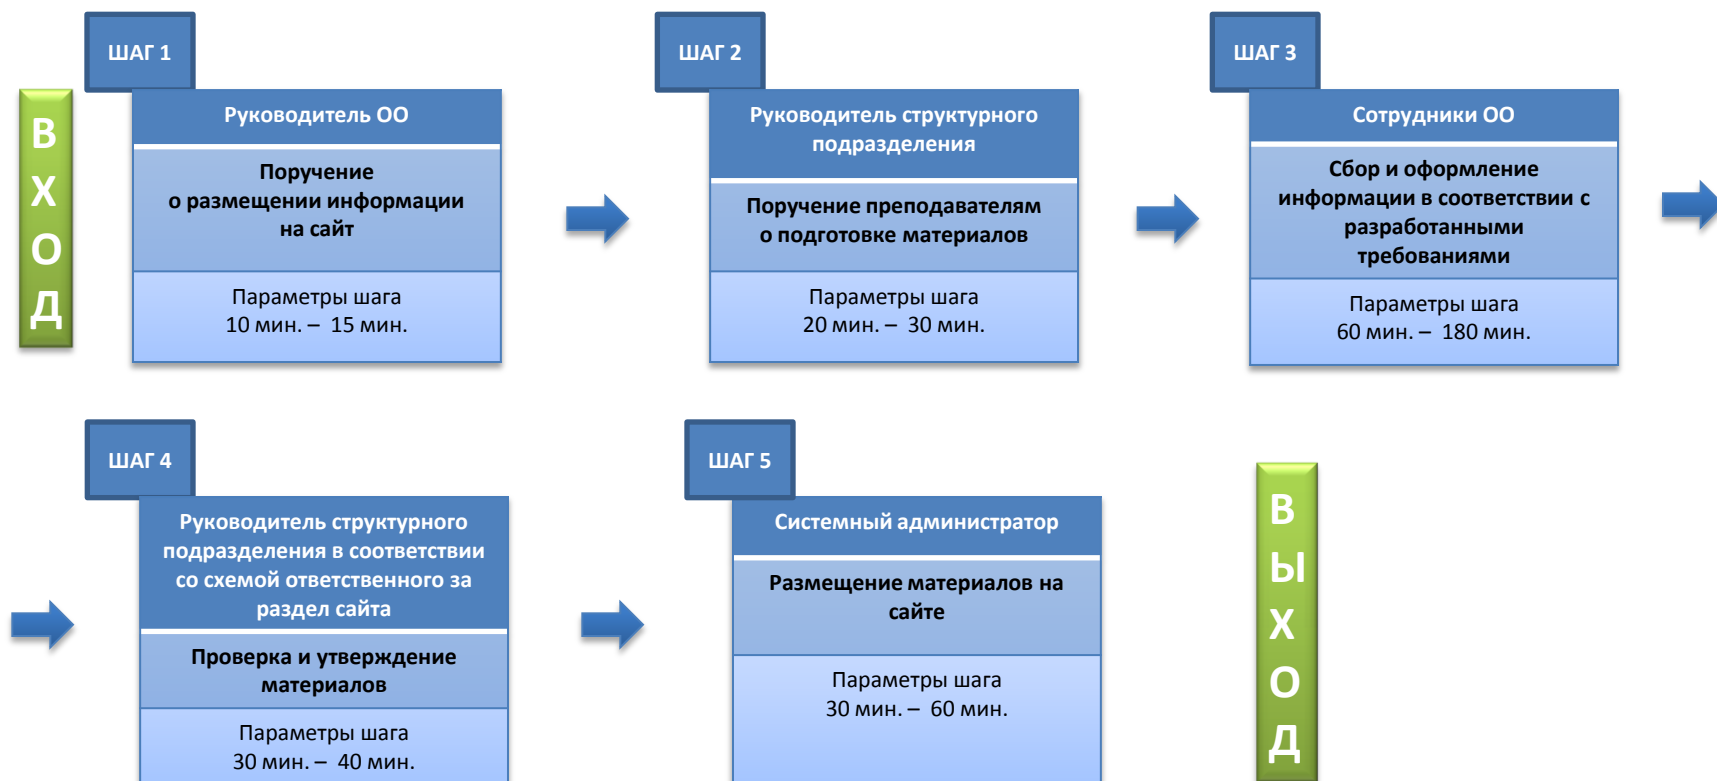

ВПП (время протекания процесса) – 150 мин. - 325 мин.

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

Цель проекта:	К 4 мая 2020 года сокращение на 30% временных затрат и оптимизация процесса подготовки и загрузки на сайт образовательной организации информации.
Способ достижения цели:	Оптимизация процесса подготовки и загрузки на сайт образовательной организации информации. Разработка требований к оформлению контента сайт ОГАПОУ «Валуйский колледж» и схемы ответственных лиц за разделы сайта.
Результат проекта:	Сокращение времени при подаче и загрузке информации на сайт образовательной организации ОГАПОУ «Валуйский колледж» .
Пользователи результатами проекта:	Сотрудники ОГАПОУ «Валуйский колледж» .

Основные блоки работ проекта

№	Наименование	Длительность, дни	Начало	Окончание	2020			
					февраль	март	апрель	май
1	Старт проекта. Создание рабочей группы по реализации проекта	1	03.02.2020 г.	03.02.2020 г.				
2	Разработка текущей карты процесса	7	04.02.2020 г.	10.02.2020 г.				
3	Поиск и выявление проблем	6	11.02.2020 г.	16.02.2020 г.				
4	Разработка целевой карты процесса	11	17.02.2020 г.	27.02.2020 г.				
5	Защита карточки проекта	1	28.02.2020 г.	28.02.2020 г.				
5	Презентация проекта	1	30.02.2020 г.	30.02.2020 г.				
6	Внедрение улучшений	65	01.03.2020 г.	04.05.2020 г.				
7	Закрытие проекта	1	04.05.2020 г.	04.05.2020 г.				
Итого		93	03.02.2020 г.	04.05.2020 г.				

Команда проекта

№	ФИО	Должность и основное место работы	Выполняемые в проекте работы
1.	Крапивина И.В.	Преподаватель «Валуйский колледж» ОГАПОУ	Руководитель проекта
2.	Шамина З.П.	Преподаватель «Валуйский колледж» ОГАПОУ	Администратор проекта
3.	Страхова О.В.	Заведующий учебной частью ОГАПОУ «Валуйский колледж»	Член рабочей группы



КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

Руководитель проекта:

Крапивина И.В.

тел.: 89507179134

e-mail: irinakrapiivna@mail.ru

Администратор проекта:

Шамина З.П.

тел.: 89517615603

e-mail: perkunz@mail.ru
